

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЛАБОРАТОРНО-ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ АТТЕСТАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР" КАЧЕСТВО"**

г.Казань ул. Енисейская - 3а
Тел. 543-53-93, 543-51-63

№ 1119
"10" 03 2009 г.



Сертификат
системы качества
по ГОСТ Р ИСО 9001-2001
№ РОСС RU.ИС66.К00112

Аттестат
аккредитации
№ РОСС
RU.0001.21СМ16
от 3.08.07 до 5.06.09

Директору ООО "ВинербергерКирпич"

Протокол №1 результатов сравнительных испытаний прочности раствора
без упрочнения и с упрочнением (СКРЕПА 500)
методом неразрушающего контроля прибором ОНИКС №156
по ГОСТ 22690-88 на объекте **Кирпичный завод в н.п. Куркачи**


Дата		Возр. р-ра.	Конструкция и расположение участков испытания	№ т.чк.	Класс(ближайшая марка) бетона по прочности		Прочн. р-ра стяжки, кг/см ²		Поставщик	Эффективность упрочнения
раствор.	испыт.				проект.	паспр.	без покрытия	с покрытием (СКРЕПА)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стяжка по плите перекрытия сушильной камеры в/о 9-11/Е-Г										
15.07.2008	06.03.2009	234	точка №1	1	50	50	37	89	ООО "Колан"	Эффективность упрочнения составляет 240%
15.07.2008	06.03.2009	234	точка №2	2	50	50	46	91	ООО "Колан"	Эффективность упрочнения составляет 197%

Заключение: В результате испытаний стяжки по плите перекрытия эффективность действия упрочнителя составила 240% и 197% соответственно.

Примечание: В соответствии с ГОСТ 22690-88 число испытаний в каждой точке равно 10

Начальник строительного отдела

Испытания произвел

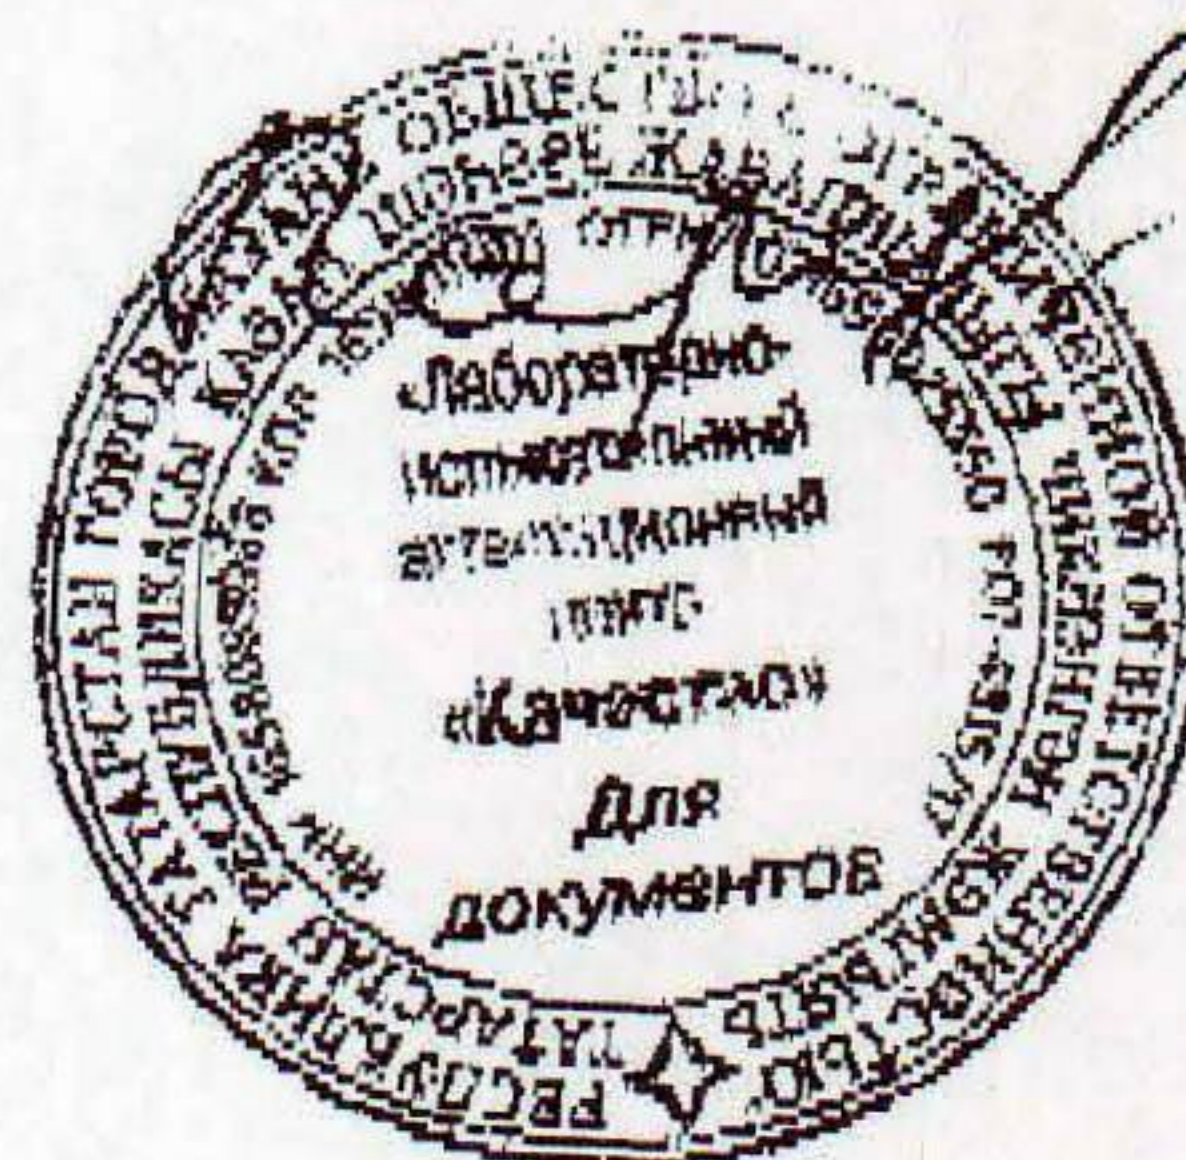

Парцвания Е.Ф.

Е.Н. Калеев
Калеев Е.Н.
